

NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:
NOMBRE DEL TUTOR DE LA EMPRESA:
NUMERO DEL TUTOR DE LA EMPRESA:
NOMBRE DEL TUTOR UPS:

CABRERA BUESTAN MILTON CRISTOBAL
CABRERA BUESTAN MILTON CRISTOBAL
0985897034
ING. Carlos Peralta

SEMANA N°
HORAS

1
30

FECHA INICIO:

04 MAR 2024

FECHA FINAL:

08 MAR 2024

SUBTOTAL

30


ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Recorrido por las instalaciones e inmediaciones de la Central Mazar, casa de máquinas, presa Mazar y Patio de maniobras.
- Mantenimiento preventivo en el Pórtico.
- Mantenimiento preventivo Barra 1 de 13.8Kv.
- Mantenimiento en las gavetas.
- Mantenimiento preventivo tablero TDGED.
- Normalización y pruebas de funcionamiento del generador principal.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 2.- Se realizó la desenergización de las líneas Molino 1 y 2, para proceder con la inspección y limpieza general de pararrayos, seccionadores, puntas de media tensión y aisladores. También se realizó la medición de resistencia de aislamiento de las acometidas Molino 1 y 2 desde el pórtico hasta el TDSM, se realizó la medición de temperatura y humedad relativa.
- 3.- Se realizó la desenergización del sistema conjuntamente con personal de operación, posteriormente se verificó la ausencia de tensión para proceder con la extracción de los interruptores y módulos invertidos: PRESA1, TAG1, TSA1, RESERVA Y ACOPLER, en los cuales se realizó limpieza, verificación del estado de las puntas de media tensión, medición de resistencia de aislamiento de los motores y bobinas de accionamiento de los interruptores de media tensión. Se midió temperatura y humedad relativa, y se ajustó las conexiones y puestas a tierra.
- 4.- Se retiró las gavetas BOAI101 y BOAI102 para proceder con la limpieza, verificación las conexiones y estado de los cables, también se realizó la contrastación de relés térmicos.
- 5.- Se realizó limpieza del tablero y limpieza del generador de emergencia, además se realizó la medición de resistencia de aislamiento del generador, pruebas de rotor, sistema de excitación e imanes permanentes del estator.
- 6.- Se realizó pruebas de funcionamiento del generador.

RESPALDO FOTOGRÁFICO:

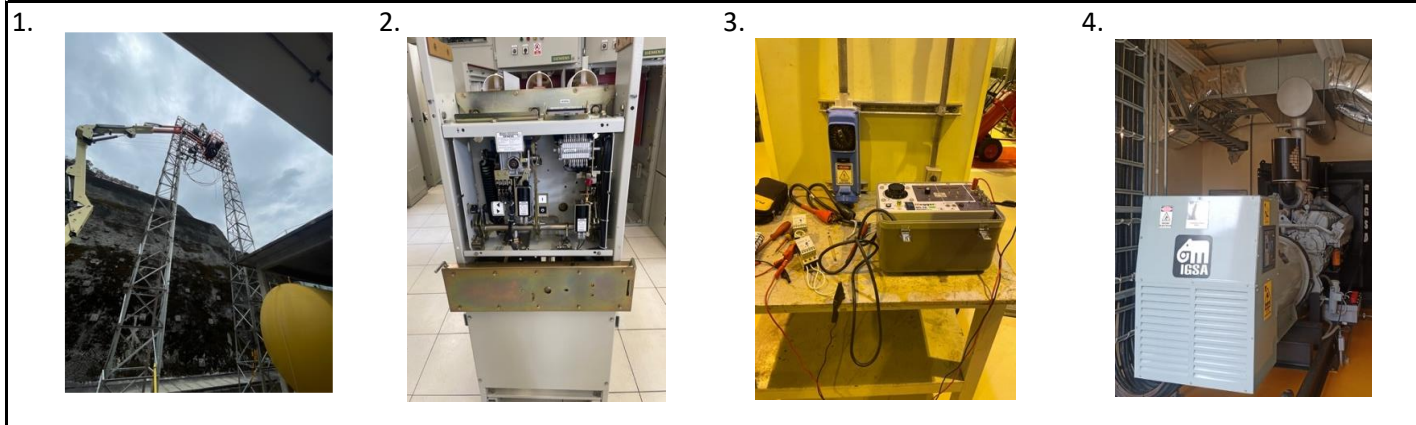

OBSERVACIONES:

Los equipos quedaron en condiciones normales de funcionamiento.

FIRMA

TUTOR DE DE LA UPS
Ing. Freddy Campoverde

FIRMA

TUTOR DE LA EMPRESA
Ing. Ernesto Sarmiento

FIRMA

ESTUDIANTE
Manuel Andrés Mejía Morales
